

Wydatki majątkowe
Gminy
Ustronie Morskie



Zaplanowane na 2008 rok wydatki w wysokości **12.500.000,00 zł** zwiększono w toku wykonywania budżetu do kwoty **12.844.291,80 zł**, tj. o 2,75 %, które zrealizowano w 12,0 %, tj. w kwocie **1.537.600,46 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczyły:

- audytu energetycznego i niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy (zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł),
- budowy ul. WczAsowej III etap w Sianożętach (nadwyżkę przeznaczono na modernizację Świetlicy Profilaktycznej w Ustroniu Morskim - zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł)
- przeniesienia zakupu zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej w Rusowie do wydatków bieżących (zmniejszenie o 4.000,00 zł),
- opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dla działek 381,380,378 (Centrum Sportowo-Rekreacyjne)- zmniejszono o kwotę 30.328,00 zł,

b) zwiększenia wydatków majątkowych dotyczyły:

- wykonania audytów energetycznych i niezbędnej dokumentacji technicznej do termomodernizacji; budynku administracyjnego Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim, Szkoły Podstawowej w Rusowie, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim (zwiększono o kwotę 41.000,0 zł w ramach rezerwy inwestycyjnej),
- zakupu mikrobusu dla niepełnosprawnych (zwiększono o kwotę 140.000,00 zł)
- studium wykonalności dla projektu budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim (zwiększono o 11.000,00 zł)
- zakupu pilarki tarczowej i kosi spalinowej na potrzeby gospodarki komunalnej (przesunięcie środków z wydatków bieżących - zwiększono o 9.400,00 zł),
- zakupu przyczepy samowyładowczej – zwiększono o 1.000,00 zł,
- zakupu zestawu komputerowego do Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim – zwiększono o kwotę 3.200,00zł,
- budowy ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią w m. Bagicz (środki przesunięto z wydatków niewygasających roku 2007 – zwiększono o kwotę 50.000,00 zł),
- wkładu Gminy na opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zwiększono o kwotę 3.404,00zł)
- budowy promenady do lotniska wraz z oświetleniem (środki przesunięto z wydatków niewygasających roku 2007 – zwiększono o kwotę 50.000,00 zł)
- zakupu serwera do obsługi programów Urzędu Gminy – zwiększono o kwotę 10.000,-zł w ramach rezerwy inwestycyjnej,
- dofinansowania zakupu samochodu typu „Furgon” dla nieetatowej grupy specjalnej KPP w Kołobrzegu (zwiększono o kwotę 7.000,-zł w ramach rezerwy inwestycyjnej),
- przełożenia gazociągu w Ustroniu Morskim – boisko sportowe przy Szkole Podstawowej (zwiększono o kwotę 200.000,-zł w ramach rezerwy inwestycyjnej),
- odtworzenia istniejących ostróg w morzu (29.000 wprowadzono z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły w roku 2007) i opłaty za pozwolenie na odtworzenie systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski (1.100 zł w ramach rezerwy inwestycyjnej) – ogółem zwiększono inwestycje o kwotę 30.100 zł,



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

- uzupełnienia dokumentacji dot. realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych na terenie Gminy przez MWiK w Kołobrzegu w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty –zwiększono o kwotę 10.000,-zł,
- modernizacji Świetlicy Profilaktycznej w Ustroniu Morskim - zwiększono o kwotę 43.000,00 zł,
- wyposażenia Świetlicy Profilaktycznej w Ustroniu Morskim – zwiększono o kwotę 60.000 zł (przesunięcie środków z wydatków bieżących),
- modernizacji ogrodzenia stadionu sportowego w ramach rezerwy inwestycyjnej – zwiększono o kwotę 164.000,00 zł,
- tablicy informującej o wynikach meczu w ramach rezerwy inwestycyjnej – zwiększono o 2.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu I półrocza wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

Dział 600 – Rolnictwo i łowiectwo	372.878,09 zł
------------------------------------------	----------------------

tj. 16,4 % planu wynoszącego 2.272.000,00 zł

Przebudowa ul. Wczasowej w Sianożętach III etap

Ulica wykonana z kostki polbruk o gr. 8 cm, szer. 6 m i dł. 294,00 m. Wbudowano także kanalizację deszczową. Odbiór wykonanych robót odbył się 03 czerwca 2008 r. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Drogowego Krężel & Bonat; ul. Szczecińska 42; 75-137 Koszalin; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 340.788,52 zł.



Przebudowa łącznika między ul. Lotniczą a ul. Północną w Sianożętach

Ciąg pieszy wykonany został z kostki polbruk gr. 8 i 6 cm, szer. 2,5 m – 3,0, dł. 105 m. Odbiór prac odbył się 03 czerwca 2008 r. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Urządzania i Renowacji Terenów mgr inż. Jolanta Staniszevska ul. Starzyńskiego 2 B/41 75-356 Koszalin; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 4.622,42 zł.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE



Remont nawierzchni bitumicznej ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

Prace zostały zlecone firmie POL-DRÓG Białogard S.A. ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard. Prace budowlane polegały na remoncie istniejącej nawierzchni poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej. Odbiór wykonanych robót odbył się dnia 11 czerwca 2008; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 1.143,13 zł.



Przebudowa ul. Ku Morzu w Sianożętach

Trwają prace drogowe polegające na przełożeniu istniejącego chodnika z kostki polbruk o powierzchni 668 m² oraz położenie nowej nawierzchni w ulicy z kostki polbruk o powierzchni 1503 m². Roboty zakończono, zgłoszono do odbioru. Wykonawcą jest Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard. Odbiór zadania odbył się 30 czerwca 2008 r.; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 10.298,72 zł.

Przebudowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ciąg pieszo jezdny wykonany z kostki polbruk gr. 8 cm wraz z odwodnieniem. Ulica o dł. 79 m i szer. 6 m. Odbiór zakończonych robót odbył się w dniu 30 czerwca 2008 r. Wykonawcą robót był Zakład Urządzania i Renowacji Terenów mgr inż. Jolanta Staniszevska ul. Starzyńskiego 2 B/41 75-356 Koszalin.; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 3.660,00 zł.



Przebudowa łącznika promenady z ul. Lotniczą przy OW Metalurg w Sianożętach Ciąg pieszo jezdny o długości 206 m i szer. 4,5 oraz stanowiska postojowe na 9 samochodów osobowych zostanie wykonany z kostki polbruk gr. 8 cm. Umowny termin zakończenia robót 07 lipca 2008 r. Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, Warszawa; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 5.450,00 zł.

Przebudowa drogi z Łasina Koszalińskiego w m.Gwizd w I półroczu poniesiono wydatki na mapy i dokumentację 95,50 zł.

Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo 2 w I półroczu poniesiono wydatki na mapy i dokumentację 488,00 zł.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie – II etap w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację techniczną 5111,80 zł.

Budowa odnogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim z oświetleniem w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację techniczną 1.220,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

173.056,46 zł

tj.25,08 % planu wynoszącego 690. 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz Został opracowany projekt budowlany. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej do pomników przyrody. Nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa łamanego, stanowiska postojowe (parking) dla samochodów osobowych



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonane zostaną z geokraty gr. 4 cm. Stanowiska dla autokarów wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Długość ścieżki 724 mb i szer. 2,5 m powierzchnia parkingu 400 m². Projekt Budowlany opracował Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Wiesław Grzywacki & Marian Jankowiak & Edyta Grzywacka Wziętek z Białogardu; w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację techniczną 5.000,00 zł.

przygotowywana jest dokumentacja do wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe. Studium Wykonalności przygotowuje WYG International z Warszawy. Ustalona kwota za przygotowanie dokumentu to 10 980,00 zł brutto. Współpracuję z firmą projektową „WIE-MAR” Wiesław Grzywacki i Marian Jankowiak z Białogardu, która wykonała projekt budowlany oraz kosztorys. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – 2009 r.

Zakup gruntów pod budowę promenady 44.072,12 zł
zakupiono grunty pod budowę promenady do lotniska

Zakup kontenerów sanitarnych w I półroczu poniesiono wydatki na zakup 3 kontenerów wraz z przyłączami w kwocie 123.984,34 zł.

Modernizacja oświetlenia Mola w Ustroniu Morskim w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków natomiast zlecono wykonanie prac za kwotę 33.000,00 zł - dokonano wymiany sześciu słupów oraz siedmiu opraw – prace zostały wykonane do 16.06.2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa	0,00 zł
-----------------------------------------	----------------

tj.100 % planu wynoszącego 551 800,00 zł

Przebudowa nawierzchni alejek na Cmentarzu w Ustroniu Morskim w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków natomiast zlecono wykonanie prac za kwotę 49.000,00 zł – termin wykonania prac od 07.07.do 08.08 br.

Dział 750 – Administracja publiczna	35.990,00 zł
--------------------------------------------	---------------------

tj.4,74% planu wynoszącego 760.000,00 zł

Zakup sejfu ognioodpornego w celu archiwizacji bazy zbiorów danych; w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 9.150,00 zł.

Modernizacja Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy wraz z pomieszczeniami socjalnymi Został opracowany projekt budowlany przez PRO-Inwest, ul. W. Łokietka 5, 87-850 Chocień. Projekt dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe, pokoje gościnne oraz salę konferencyjną wraz z remontem dachu i elewacji. Powierzchnia użytkowa projektowanej części będzie wynosić 363,9 m². Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Budownictwa na odstępstwa, tj. odległość od granicy działki mniejsza niż 4 m) Urząd Gminy złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 26.840,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.202,00 zł
-----------------------------------------	--------------------

tj.1,41% planu wynoszącego 227.702,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Rusowie: poniesione wydatki dotyczyły tych obiektów i wkładu pieniężnego na wykonanie studium wykonalności w Związku Dorzecza Parsęty w Karlinie 1.702,00 zł oraz własnym uzupełnieniu brakującej dokumentacji na to zadanie w kwocie 1.500,00 zł.

Gimnazjum w Ustroniu Morskim: *przygotowywana jest dokumentacja do wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna- szkolnictwo gimnazjalne. Studium Wykonalności przygotowuje WYG International z Warszawy. Ustalona kwota za przygotowanie dokumentu to 10 980,00 zł brutto. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – 2009 r.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia	42.821,49 zł
------------------------------------	---------------------

tj.12,37% planu wynoszącego 346.051,00 zł

Modernizacja Świetlicy Profilaktycznej w Ustroniu Morskim

Wykonano prace budowlane – remontowe świetlicy TPD przy ośrodku zdrowia w Ustroniu Morskim. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe NAT-TOM Alicja Kozłowska z Nieszawy. Odbiór odbył się w dniu 18 czerwca 2008 r.; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 39.410,40 zł.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim wraz z wymianą okien i modernizacją kotłowni

Wykonano dokumentację za kwotę 3.411,09zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.430,63 zł
--------------------------------------------------------------	----------------------

tj.7,90% planu wynoszącego 1.890.500,00 zł

Zakup przyczepy samowyladowczej dla gospodarki komunalnej	20.999,99
-----------------------------------------------------------	-----------

Zakup pilarki tarczowej dla gospodarki komunalne	5.002,00
--------------------------------------------------	----------

Zakup samochodu dostawczego (Ford transit) dla gospodarki komunalne	97.662,50
---------------------------------------------------------------------	-----------

Oświetlenie ul. Rybackiej do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim Urząd Gminy zakupił projekt budowlany oświetlenia ul. od ul. Rybackiej do ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. Przewiduje się wbudowanie 12 słupów oświetleniowych na długości 407,5 m. W dniu 17 czerwca 2008 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu; wartość poniesionych wydatków 4.905,28 zł.

Budowa oświetlenia końca ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim Urząd Gminy wydatkował środki na przygotowanie dokumentacji 976,00zł.

Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dotyczący realizacji zadań na terenie Gminy Ustronie Morskie jest zrealizowany średnio w ok. 95 %. Nie jest jeszcze znany termin przyłączenia gospodarstw do wodociągu i kanalizacji; w I półroczu



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

wydatkowano ze budżetu Gminy kwotę 18.809,86 zł w celu uzupełnienia brakujących elementów dokumentacji.

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu W 2007 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego odtworzenia istniejących ostróg w morzu na odcinku od 321 do 324 km wybrzeża (od Ustronia Morskiego do Sianożęt). W związku z zaleceniem Urzędu Morskiego w Słupsku projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia do Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie i uzyskał pozytywne pozwolenia Nr 1/08 z dnia 12 maja 2008 r. Obecnie projektant złożył w dniu 25 czerwca 2008 r. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie; w I półroczu wydatkowano ze budżetu Gminy kwotę 1.075,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.191,20 zł
-------------------------------------------------------------	---------------------

tj.8,48% planu wynoszącego 509.535,00 zł

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sianożętach

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę – decyzja B.7351-1007/2007 z dnia 23 stycznia 2008 r. Projekt przewiduje wykonanie budynku parterowego o powierzchni zabudowy 173,67 m², powierzchnia całkowita 150,40 m², kubatura 824,00 m³; w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rusowie	37.640,20
-------------------------------------------------------	------------------

W obecnym czasie obiekt jest wyposażany przed oddaniem do ostatecznego użytku.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	1.651,00 zł
------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Wykonano dokumentację za kwotę

Zakup kserokopiarki do Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	3.900,00 zł
------------------------------------------------------------------------	--------------------

Wykonano dokumentację za kwotę 3.411,00zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii – trwają przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie- Odnowa i rozwój wsi. Jestem w trakcie kompletowania dokumentacji oraz wypełniania wniosku. Gmina, która stara się o dofinansowanie z PROW musi spełniać określone warunki sytuacyjne, dochodowe, dot. stanu bezrobocia itd. Maksymalnie można uzyskać 7 punktów w ocenie końcowej. Minimalna ilość punktów z jaką można składać wniosek to 3. Remont świetlicy może być finansowany z PROW-u gdyż spełnia kryterium regionalne tj. dot. rewitalizacji budynku zabytkowego – 2 pkt. (budynek jest wpisany do ewidencji zabytków, o potwierdzenie tego faktu wystąpię do konserwatora zabytków w Koszalinie), wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wyniesie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych – 1 pkt. Gmina Ustronie Morskie innych kryteriów, za które mogłaby otrzymać dodatkowe punkty nie spełnia. Konkurs prawdopodobnie będzie ogłoszony jeszcze w 2008 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	717.030,59 zł
---------------------------------------------	----------------------

tj.12,45 % planu wynoszącego 5.759.988,00 zł



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	477.666,59 zł
W dniu 14 lutego 2008 r. podpisano umowę z Eiffage Budownictwo Mitex S.A. z siedzibą w Warszawie o przeniesienie praw majątkowych do dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. W dniu 21 lutego 2008 r. Urząd Gminy Ustronie Morskie przejął od Eiffage Budownictwo Mitex S.A plac budowy. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pracowni Projektowej Paweł Tieplow, ul. Osowska 27 m 5, Warszawa opracowanej w 2006 r.	
Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	226.310,00 zł
w I półroczu poniesiono wydatki związane z kosztem dokumentacji projektowej; <i>przygotowywana jest dokumentacja do wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa. Obecnie firma WYG International Sp. z o.o z Warszawy przygotowuje Studium Wykonalności . Ustalona kwota wykonania zadania to 10 980, 00 zł brutto. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – 2009 r.</i>	
Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ustroniu Morskim	854,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie Gminy w:	12.200,00 zł
1. Rusowie	
2. Wieniotowie	
3. Ustroniu Morskim	
4. Kukinii	

Inwestycje były zgłoszone do realizacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2007-2013, wniosek składał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Niestety nie został zakwalifikowany w fazie oceny merytorycznej.

W związku z powyższym planuje się złożyć aplikacje do PROW 2007-2013. Zlecono firmie ABACUS z Kołobrzegu aktualizację dokumentacji technicznej tj. kosztorysów inwestorskich, projektów budowlanych, specyfikacje techniczne, przedmiary robót.

Po ogłoszeniu kryteriów kwalifikacyjnych okazało się że nasza gmina ich nie spełnia. Obecnie poszukujemy innego źródła finansowania inwestycji.

Poza tym należy zauważyć, iż:

- projekt **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** – jest w fazie przygotowania dokumentacji, realizowany przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Przewiduje się pozyskać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycje zgłoszone do realizacji;

1. Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim
2. Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
3. Szkoła Podstawowa w Rusowie
4. Dom Kultury w Ustroniu Morskim

Firma KOLBEK-BUD-PLAN z Kołobrzegu otrzymała zlecenie aktualizacji audytów energetycznych, za które zapłacono łącznie 3000 zł brutto. Obecnie przygotowuje pozostałą dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniami. Łączna kwota usługi 26 500 zł brutto. Realizacja powyższych zadań znacznie się przedłuża ze względów proceduralnych stawianych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Na dzień dzisiejszy przyjęto zgłoszenia na budowę dot. Ośrodka Zdrowia oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie


WYDATKI MAJĄTKOWE

Morskim. Na pozostałe dokumenty oczekujemy. Płatność za usługę nastąpi po dostarczeniu przez KOLBEK-BUD-PLAN wszystkich dokumentów. Zakłada się, że procedura konkursowa zostanie ogłoszona pod koniec 2008 r. lub na początku 2009.

- **Międzynarodowa nadmorska trasa rowerowa Dźwirzyno-Kołobrzeg- Ustronie Morskie** – w kwietniu 2008 r. podpisano trójstronną umowę o współpracy między gminami Ustronie Morskie, Kołobrzeg (partnerzy w projekcie) a miastem Kołobrzeg (lider w projekcie). Każdy ze swojej strony przygotował dokumentację niezbędną do opracowania studium wykonalności oraz złożenia wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Wniosek został przyjęty do oceny formalnej, jednak w późniejszym etapie odpadł. Będziemy ponownie aplikować z powyższym wnioskiem do INTERREGU IV, po ogłoszeniu konkursu.

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie** – w maju 2008 r. zgłoszono dwa zadania do realizacji w latach 2009-2012 przy współudziale środków z WFOŚiGW, są to;

1. odtworzenie istniejących ostróg w morzu,
2. rekultywacja wysypiska odpadów w Kukinii.

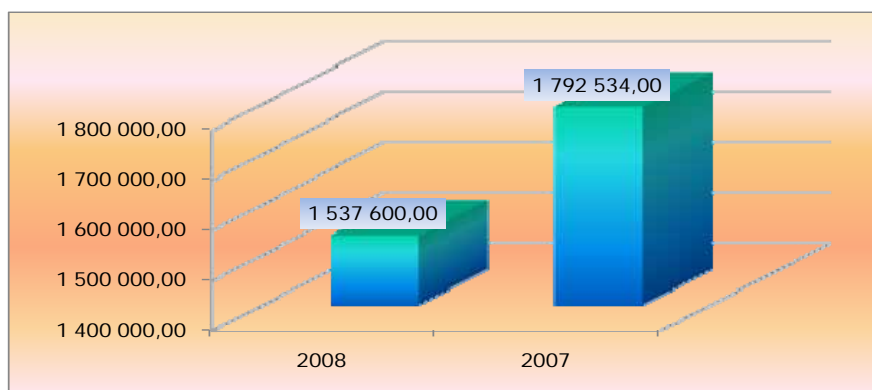

Szczegółowe dane w formie tabelarycznej zostały przedstawione w załączniku nr 14, str. 169.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone

załącznik nr 14

do Zarządzenia Nr 77

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25.08.2008 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 30.06.2008 r.	Wsk. % /7:6/	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wsk. % /12:7/	Wsk. % /12:9/	Wsk. % /12:10/	Wsk. % /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zadania własne gminy															
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	125 409,67	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	0	125 409,67	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	1 644 108	3 054 480,71	1 591 386,34	2 315 000	2 272 000	98,1	174 929,00	848 653,97	50 731,02	372 878,09	16,4	213,2	43,9	735,0
	* inwestycje budowlane	1 632 819	3 054 480,71	1 591 386,34	2 315 000	2 272 000	98,1	168 940,00	848 653,97	16 871,02	372 878,09	16,4	220,7	43,9	2 210,2
	* zakupy inwestycyjne	11 289	0,00	0,00	0	0	0,0	5 989,00	0,00	33 860,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* udziały w spółkach	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Turystyka	215 225	0,00	372 574,89	590 000	690 000	116,9	174 929,00	848 653,97	50 731,02	173 056,46	25,1	98,9	20,4	341,1
	* inwestycje budowlane	215 225	0,00	345 824,89	290 000	390 000	134,5	168 940,00	848 653,97	16 871,02	49 072,12	12,6	29,0	5,8	290,9
	* zakupy inwestycyjne	0	0,00	26 750,00	300 000	300 000	100,0	5 989,00	0,00	33 860,00	123 984,34	41,3	2 070,2	0,0	366,2
	* udziały w spółkach	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 065	1 759,90	551 798,38	40 000	40 000	100,0	0,00	0,00	631 341,53	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	45 065	1 759,90	551 798,38	40 000	40 000	100,0	0,00	0,00	631 341,53	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* wykupy gruntów, budynków	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* udziały w spółkach	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	12 000	11 444,58	0,00	170 000	170 000	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	12 000	11 444,58	0,00	170 000	170 000	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	47 945	609 049,68	2 567 782,14	610 000	760 000	124,6	31 135,00	100 740,45	232 537,13	35 990,00	4,7	115,6	35,7	15,5
	* inwestycje budowlane	0	519 999,95	2 336 743,94	500 000	500 000	100,0	0,00	100 740,45	232 537,13	26 840,00	5,4	0,0	26,6	11,5
	* zakupy inwestycyjne	46 945	89 049,73	231 038,20	110 000	260 000	236,4	30 135,00	0,00	0,00	9 150,00	3,5	30,4	0,0	0,0
	* udziały w spółkach	1 000	0,00	0,00	0	0	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 108	13 910,00	71 970,50	85 000	92 000	108,2	42 249,00	0,00	10 520,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	70 407	0,00	7 200,00	0	0	0,0	42 249,00	0,00	10 520,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	25 701	13 910,00	64 770,50	85 000	92 000	108,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia				490 000,00	86 515,80	17,7				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* rezerwy ogólne i celowe				490 000	86 515,80					0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	179 476	335 899,86	2 686 270,20	4 000	227 702	5 692,6	21 607,00	1 900,00	700 600,02	3 202,00	1,4	14,8	168,5	0,5
	* inwestycje budowlane	167 838	333 999,86	2 679 478,46	0	227 702	0,0	7 400,00	0,00	693 808,28	1 702,00	0,7	23,0	0,0	0,2

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 30.06.2008 r.	Wsk. % /7:6/	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wsk. % /12:7/	Wsk. % /12:9/	Wsk. % /12:10/	Wsk. % /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	* zakupy inwestycyjne	11 638	1 900,00	6 791,74	4 000	0	0,0	14 207,00	1 900,00	6 791,74	1 500,00	0,0	10,6	78,9	22,1
851	Ochrona zdrowia	8 196	0,00	149 234,00	235 200	346 051	147,1	1 693,00	0,00	0,00	42 821,49	12,4	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	3 050	0,00	149 234,00	235 200	286 051	121,6	0,00	0,00	0,00	42 821,49	15,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	5 146	0,00	0,00	0	60 000	0,0	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	610	3 900,00	12 167,60	0	0	0,0	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane			0,00	0	0	0,0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	610	3 900,00	12 167,60	0	0	0,0	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 995		0,00	0	0	0,0	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	9 995		0,00	0	0	0,0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne		3 900,00	12 167,60	0	0	0,0	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 750	854 745,47	255 553,97	1 840 000	1 890 500	102,7	301 453,00	511 442,86	163 153,95	149 430,63	7,9	49,6	29,2	91,6
	* inwestycje budowlane	9 995		0,00	0	0	0,0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0		0,00	0	0	0,0	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 561	69 367,32	55 458,25	496 484	509 535	102,6	10 000,00	44 359,56	3 649,65	43 191,20	8,5	431,9	97,4	1 183,4
	* inwestycje budowlane	769 750	646 677,07	126 714,38	1 495 000	1 535 100	102,7	109 389,00	354 353,94	42 414,35	19 884,86	1,3	18,2	5,6	46,9
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0,00	0,00	225 000	225 000	100,0	0,00	0,00	0,00	5 881,28	2,6	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	251 000	208 068,40	128 839,59	120 000	130 400	108,7	192 064,00	157 088,92	120 739,60	123 664,49	94,8	0,0	78,7	102,4
	* udziały w spółkach			0	0	0	0,0				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	14 666	2 269 089,67	24 400,00	5 624 316	5 759 988	102,4	0,00	0,00	0,00	717 030,59	12,5	0,0	0,0	0,0
	* inwestycje budowlane	14 666	2 269 089,67	24 400,00	5 603 316	5 736 988	102,4	0,00	0,00	0,00	717 030,59	12,5	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	21 000	23 000	109,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	* udziały w spółkach			0,00	0	0	0,0			0,00	0,00	0,0	0	0	0,0
	Razem zadania własne gminy:	3 330 705	7 349 056,86	8 338 596,27	12 500 000,00	12 844 291,80	102,8	757 995	2 359 650,81	1 843 264,82	1 537 600,46	12,0	202,9	65,2	83,4
	<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Z tego:</i>														
	* inwestycje budowlane	2 939 272	7 020 784,15	7 868 238,64	10 956 900,00	11 437 076,00	104,4	496 918	2 196 761,89	1 648 013,48	1 233 383,85	10,8	248,2	56,1	74,8
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	100,0	0	0	0,00	5 881,28	0,0	0,0	0,0	0,0
	* zakupy inwestycyjne	380 438	316 828,13	470 357,63	658 100,00	925 700,00	140,7	260 077	162 888,92	195 251,34	298 335,33	32,2	114,7	183,2	152,8
	* udziały w spółkach	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	* rezerwy ogólne i celowe					86 515,80					0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	zadania zlecone gminy														
	Ogółem wydatki majątkowe:	#ADR!	#ADR!	8 338 596,27	12 500 000,00	12 844 291,80	102,8	757 995,00	2 359 650,81	1 843 264,82	1 537 600,46	12,0	202,9	65,2	83,4
	<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
